SKOLEGATA

Nr.		Klasse
Nr.	1 a	-
	1 b	-
	2 a	C
	2 b	-
	3	C
	4	C
	5	C
	6	C
	7	C
	12	C
	14	C
	16	C

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Skolegt. nr. 1A
Betegnelse

Eier 1970: Furunes, Ole
Takst kr. 30000 Areal tomt 285 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein.
Vegger: Tømmer stående panel.
Tak: Saltak, skifer.

Kjeller: Under hele huset

Eksteriør: Enkel symmetrisk fasade. T-post vinduer, med flat omramming. Overbord på konsoller.

Interiør: Eldre lister og dører.

Gårdsplass, Uthus: Gras / heller. Ustelt.
To etg. bind.verk. Ubebodd. Dårlig.

Ombygging:
1877 Se prot., 30/5 (BA)
1950 Nytt tilbygg i kjelleren i hjørnet mot gårdsplassen. Flytting av kjellertrapp. 2 WC i kjllertilbygg (BA)

Tegninger, oppmålinger
1950 Plan kjeller 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: B-C
Miljøvurdering: B

Prioritering

Dato: 26.9.74
Sign: JT

II.

Gate Skolegt.	nr. 1A
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



142.84


I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Skolegt. nr. 1B
Betegnelse	
Eier 1970	Lundahl, Petter
Takst kr.	18 000 — Areal tomt 125 m². bygninger m²
Bruk	Bolig
Oppført (KJENT)	tidligst — senest — omkring (ANTATT)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein
Vegger	Tømmer, liggende faspanel
Tak	Saltak med valm mot gavl og avkuttet hjørne
Kjeller	Delvis
Eksteriør	Modernisert. Utskåret stakittgjerde
Interiør	Modernisert
Gårdsplass,	Hellelagt. Trang. Velstelt. Vannpost
Uthus	To etg. bind.verk. Ubebodd. Bra
Ombygging	1865 Se prot, 25.8. (BA) 1960 WC med dusj i 1.etg. (BA)
Tegninger, oppmålinger	
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	
Dato	25.9.74
Sign	JT

II.

Gate Skolegt.	nr. 1B
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

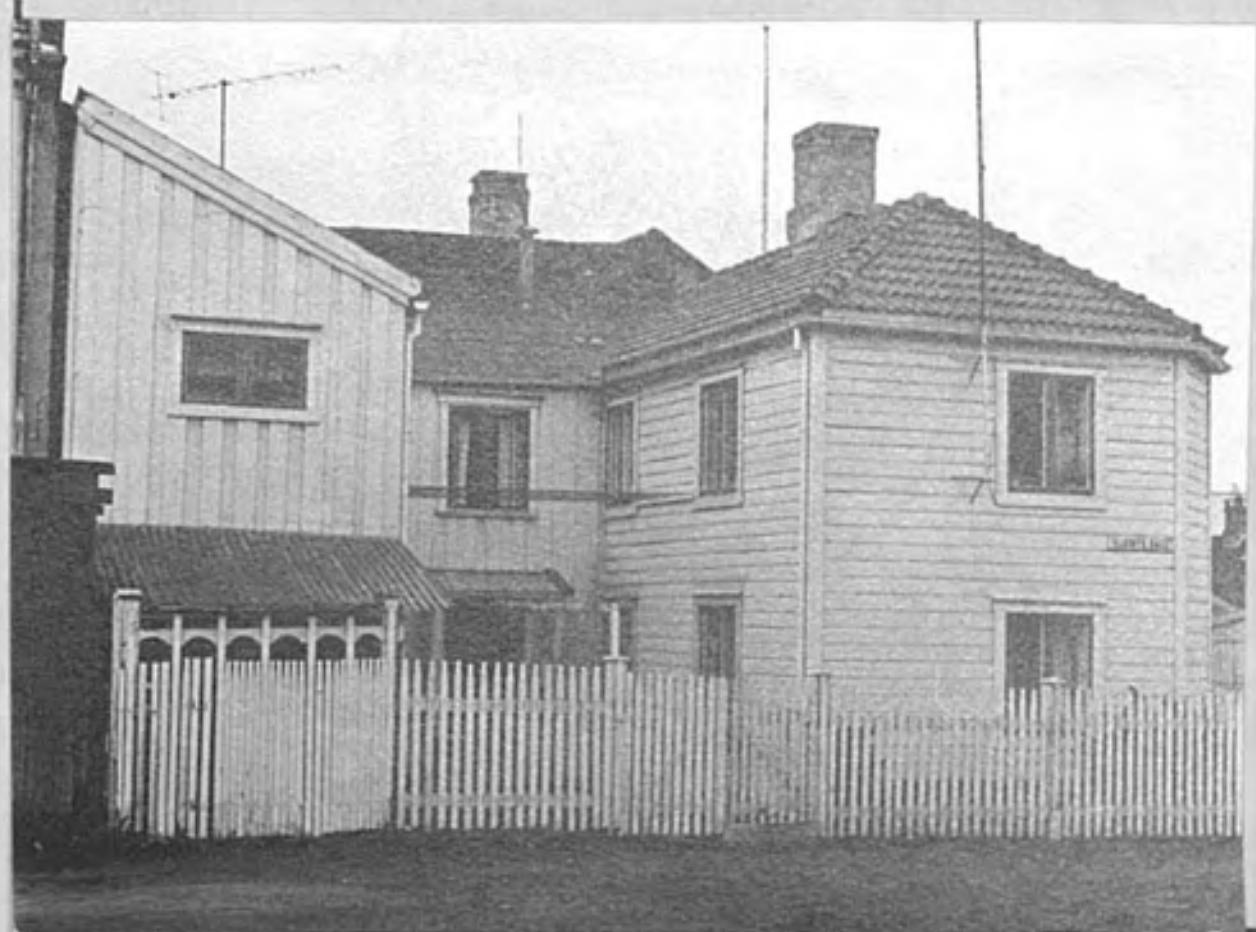

144.79

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Skolegt. nr. 2A
Betegnelse:

Eier 1970: Rønning, Johan P.
Takst kr. 145 000 — Areal tomt 480 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført (KJENT) — tidligst — senest — omkring (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer $2\frac{1}{2}$

Grunnmur: Pusset mur
Vegger: Pusset mur
Tak: Saltak, skifer
Flere skrå kobbhus

Kjeller: Under hele huset

Eksteriør: Pussfasade med profilerte vindusomr. og horisontalbånd.
Inntrukne felt med profilering under vinduer i 1.etg.

Interiør: T-post vinduer med hele ruter.

Gårdsplass, Uthus: Grus, trang.
1. etg. skur.

Ombygging:
1902 2 etg. bolighus (BA)
1942 Kobbhus istedet for liggende takvindu (BA)

Tegninger, oppmålinger:
1902 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 25.9.74
Sign: JT

Gate Skolegt.	nr. 2A
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer



142.14

II.

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Skolegt. nr. 2B
Betegnelse:

Eier 1970: Johansen, Borghild
Takst kr. 45 000 Areal tomt 235 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 3

Grunnmur: Pusset stein.
Vegger: Tømmer, stående panel.
Tak: Saltak, valmet i gavl. Skifer

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Harmonisk fasade med jevnt fordelte to fags vinduer, med tre ruter. Flat omramming med utskjæring i overstykke. Tofløyet fyllingsdør med glassfelt og overlysfelt. Profilert omramming med sterkt markert overstykke.
* ~~Interiør~~

Gårdsplass, Brostein, Utetrapp fra 1.etg. til 2.etg. Uthus.
Uthus: To etg. bind.verk. Ubebodd. Dårlig

Ombygging

1865	Se prot. 29.3	(BA)
1877	" " 29.9	(BA)
1882	Innredn. av kjeller	(BA)
1902	Utvidelse av 1.etg. mot portrom	(BA)
1968	WC og dusj i 1., 2. og 3. etg. ved bitrappen	(BA)

Tegninger, oppmålinger

1902 Planer 1. og 2. etg. 1: 100 (BA)

*Interiør: En del eldre listeprofiler.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering

Dato 24.9.74
Sign JT

II.

Gate	Skolegt.	nr.	2B

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?


Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Skolegt. nr. 3
Betegnelse	
Eier 1970	Eriksen, Thoralf
Takst kr.	22 000 Areal tomt 111 m². bygninger m²
Bruk	Bolig
Oppført (KJENT)	tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein
Vegger	Tømmer, stående panel
Tak	Saltak, tegl.
Kjeller	Delvis
Eksteriør	To fags vinduer i grupper. Flat omramming. To fløyet portdør med overlysfelt.
Interiør	Delvis modernisert
Gårdsplass, Uthus	Heller
Ombygging	
Tegninger, oppmålinger	
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B - C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C
Dato	25.9 74
Sign	JT

Gate Skolegt.	nr. 3
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

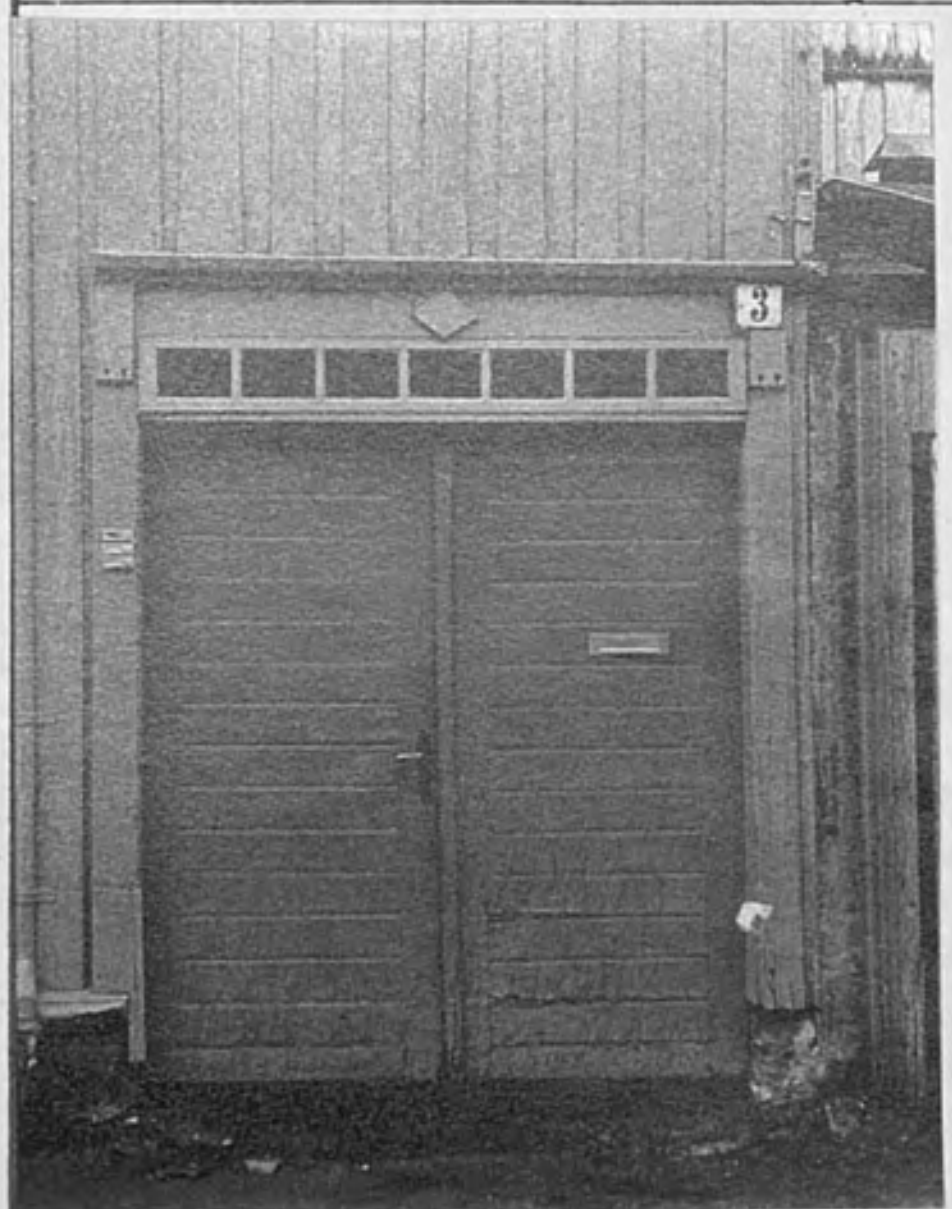

142.87



142.86

1.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Skolegt. nr. 4
Betegnelse:

Eier 1970: Eidebakk, Else Marie
Takst kr. 35 000 Areal tomt 269m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ____ (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann
Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål
Etasjer 2

Grunnmur: Pusset mur
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Saltak, ny tegl
Kjeller: Delvis

Eksteriør: Enkelt utstyrt, fasade med to-fags vinduer i grupper. To ruter i faget, flat omramming med markert over- og understykke
Interiør: Eldre listeprofiler og dører

Gårdsplass, Uthus: Hellelagt, Meget velstelt, Vannpost. [illegible] etg. boder. Bind.verk. Ubebodd. Bra

Ombygging

1864	Se prot., 26/4	(BA)
1869	" " 21/9	(BA)
1919	Bygging av 2.etg. hermetikkfabrikk (BA)	
1958	Utv. av trappehus på hovedbygn. Innredning av WC i 1. og 2.etg. i trappehuset (BA)	
1965	Innredning av dusj i 2. etg. (BA)	

Tegninger, oppmålinger

1919	Planer, snitt, fasade mot gårdsplass for hermetikkfabrikk. Sit.plan. 1:100 (BA)
1958	Planer 1. og 2.etg., fasade mot gårdsplass for h.bygn. 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato: 20.9.74
Sign: JT

II.

Gate Skolegt. nr. 4

Eldre bilder

Foto

Litteratur


Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

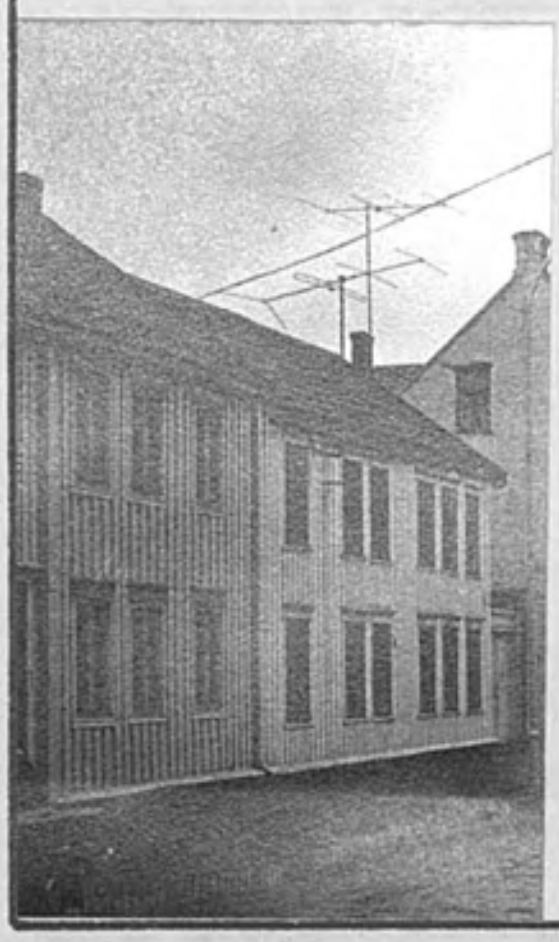

142.6

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Skolegt. nr. 5

Betegnelse

Eier 1970 Sand, Jenny

Takst kr. 32.000 Areal tomt 229 m². bygninger m²

Bruk Bolig

Oppført ____ (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)

Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk

Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein, hel.

Vegger Tömmer, stående panel.

Tak Saltak, tegl.

Kjeller Delvis.

Eksteriør Symmetrisk fasade m. tofags vinduer m. tre ruter. Flat omramming m. prof. overstykke på kraftige konsoller. Fallstang.

Interiør

Gårdsplass, Hellelagt. Meget velstelt. Vannpost.

Uthus To etg. bind.verk. Ubebodd. Dårlig.

Ombygging

1876 Se prot. (11.3.) (BA)
1929 Garasje av mur. (BA)

Tegninger, oppmålinger

1929 Planer, snitt, fasade av garasje. 1:50. Sit.plan 1:200. (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 25.9.74
Sign J.T.

11.

Gate Skolegt.	nr. 5
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



142.88

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Skolegt. nr. 6

Betegnelse

Eier 1970 Hvidsand, Fritz

Takst kr. 18.000 Areal tomt 158 m² bygninger m²

Bruk Bolig

Oppført KJENT tidligst senest omkring ANTATT

Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk

Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein, hel.

Vegger Tömmer, stående panel.

Tak Saltak, tegl.

Kjeller Delvis.

Eksteriør Laftekasse mot port. Tp-fags vinder m. tre ruter og flat omramming, jevnt fordelte. Toflöyet port.

Interiør Eldre lister, dörer.

Gårdsplass, Grus, heller. Meget velholdt. Vannpost.

Uthus 2 etg. bind.verk. Ubebodd. Bra

Ombygging

1959 Tilbygg for WC i 1. et. mot gårdsplass (1,5 m² gr.areal). (BA)

Tegninger, oppmålinger

1959 Plan 1. et. Snitt 1:100. Sit.plan 1:250. (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positive

Vedlikeholdstilstand B

Antikvarisk tilstand B

Arkitekturvurdering B

Miljøvurdering B


Prioritering C

Dato 25.9.74

Sign J.T.

II.

Gate Skolegt.	**nr.** 6
Eldre bilder	**Foto**
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

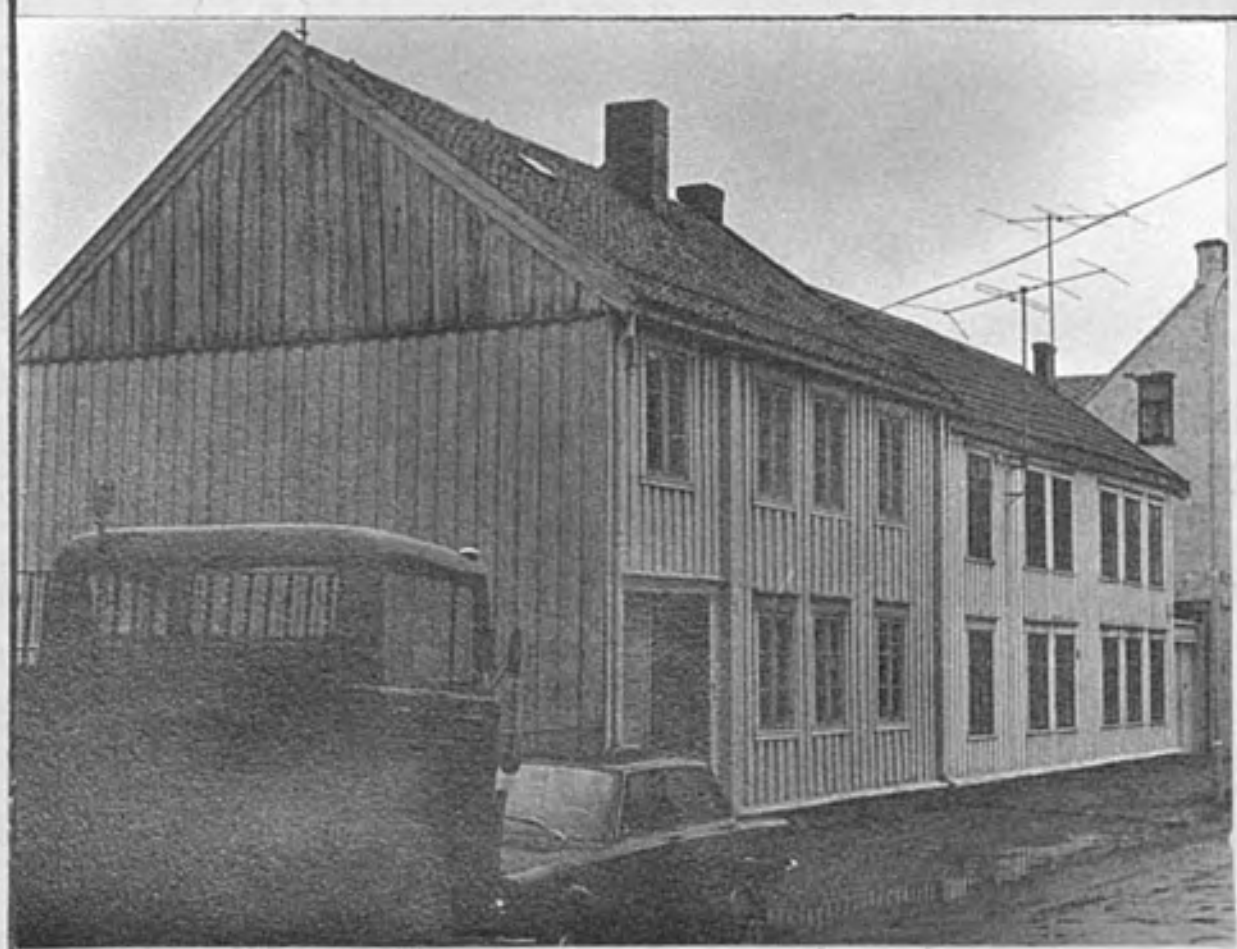

142.6

↑ (6) ↑ (4)

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Skolegt. nr. 7
Betegnelse

Eier 1970: Kristensen, Alfred m.fl.
Takst kr.: 50.000 Areal tomt 500 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein, sprukket.
Vegger: Tömmer. Stående panel.
Tak: Saltak, tegl.

Kjeller

Eksteriør: Stram fasade m. to-fagsvinduer i grupper. Tre ruter i faget m. flat omramming og markert overbord. Stor toflöyet port m. fyllingsdörer. Inngangsdör skåret ut i portdör.
Interiør: En del tre opprinnelig.

Gårdsplass: Gress, grus. Vannpost. Meget rommelig.
Uthus: To etg. mur, bebodd. Bra.

Ombygging
1910 Stall og skur (BA)
1913 Utvidelse av stallen (BA)
1927 Del av skur - kasseverksted (BA)
1928 Innredn. av snekkerverksted i 1. et. av stallen (BA)
1932 Innredn. av tidl. stall/snekkerverksted til beboelse (BA)

Tegninger, oppmålinger
1910 Sit.plan 1:250 (BA)
1913 Planer, snitt, fasade for stall. Plan 1.et. h.bygn. 1:100 (BA)
1932 Planer,snitt,fasade for endring av tidl. stall/snekkerverksted 1:100 (BA)
1932 Sit.plan (BA)

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato: 25.9.74
Sign: J.T.

II.

Gate Skolegt.	**nr.** 7
Eldre bilder	**Foto**
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



142.90

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Skolegt. nr. 12
Betegnelse

Eier 1970 Strömberg, Unni
Takst kr. 25.000 Areal tomt 171 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført (kjent) tidligst senest omkring (antatt)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein.
Vegger Tömmer, liggende faspanel.
Tak Saltak skifer.

Kjeller Delvis.

Eksteriør To fags vinduer delvis i grupper. Tre ruter i faget, flat profilert omramming. Fyllingsdör.

Interiør En del eldre lister og dörer, en del modernisert.

Gårdsplass, sementert.
Uthus Et etg. bind.verk.

Ombygging
1889 Ombygging av uthus til stall. (BA)
1918 Ny stall i 2. et. Flöy i 2 et. til h.bygn. mot gårdsplass. Endring av fasade mot Skolegt. (Port, 2 nye vinduer.) (BA)
1968 WC i 1. et. i flöy mot vest. Dusjbad og WC i 2. et. i samme flöy. (BA)

Tegninger, oppmålinger
1918 Planer, snitt, fasade 1:100 (BA)

Ønskelige forandringer
Gavl vegg paneles.

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 25.9.74
Sign J.T.

II.

Gate Skolegt.	nr. 12
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



142.4

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Skolegt. nr. 14
Betegnelse

Eier 1970: Wold, Arvid R.
Takst kr.: 22.000 Areal tomt 146 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 1

Grunnmur: Pusset stein.
Vegger: Tömmer, stående panel.
Tak: Saltak, tegl.

Kjeller: Delvis.

Eksteriør: To-fags vinduer m. to ruter. Flat omramming.

Interiør: Delvis modernisert.

Gårdsplass, Uthus: Meget velholdt. Heller, gras.
En etg., bind.verk.

Ombygging
1872 Se prot. (25.9.) (BA)
1968 Innredn. av bad og W.C. i 1. et. i flöy mot gården. (BA)

Tegninger, oppmålinger

Bygget etter nr. 12.

Ønskelige forandringer


Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand	A-B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 24.9.74
Sign: J.T.

II.

Gate Skolegt.	nr. 14
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

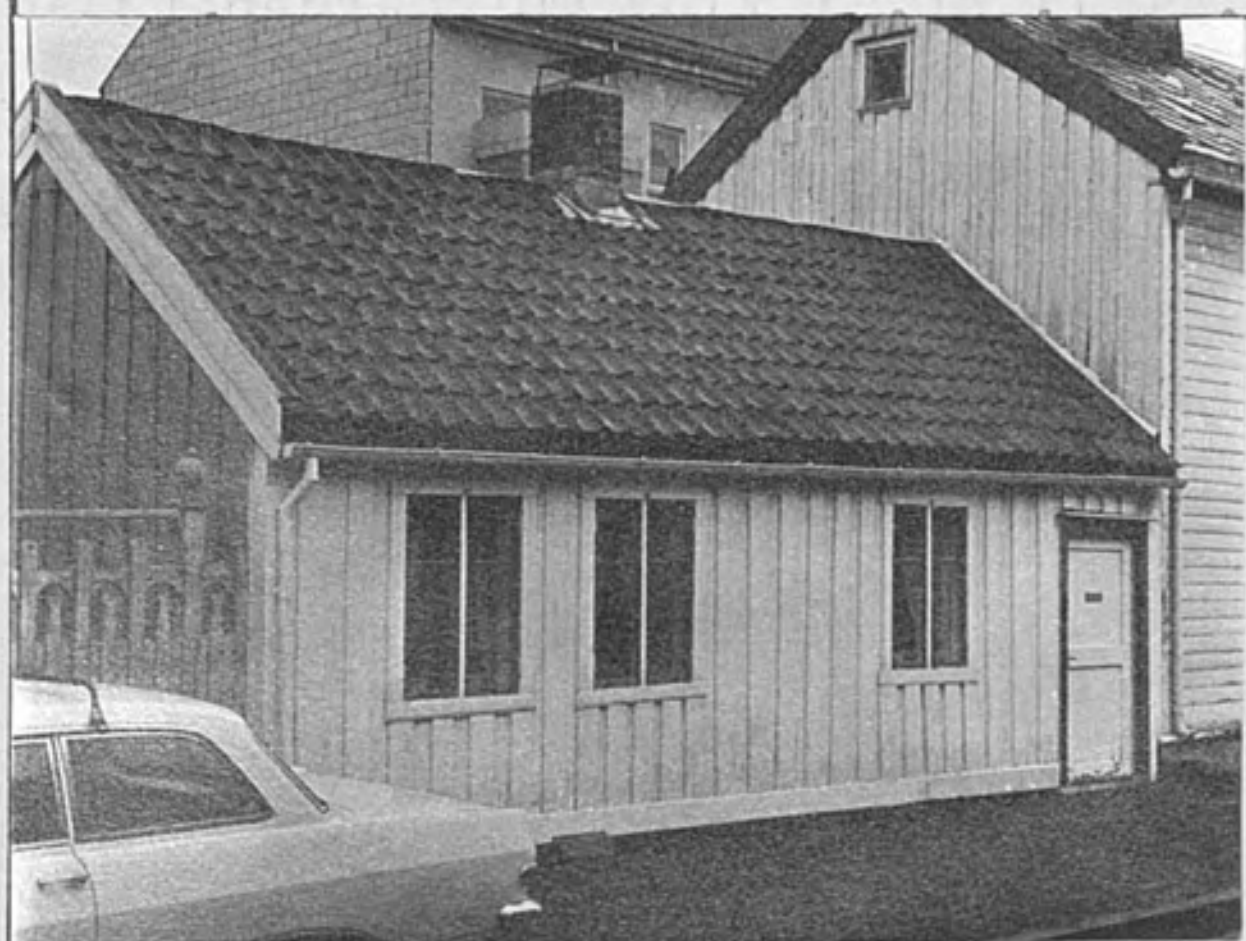

142.3

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Skolegt. nr. 16
Betegnelse	
Eier 1970	Iversen, Gudrun
Takst kr.	20 000 Areal tomt 109 m². bygninger m²
Bruk	Bolig
Oppført (kjent)	tidligst senest omkring (antatt)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 1 (½)
Grunnmur	Pusset mjr
Vegger	Tømmer, stående panel
Tak	Saltak, tegl.
Kjeller	Delvis
Eksteriør	Uordnet fasade m.fl. vindustyper. Flat omramming m. overbord på konsoller. Større vinduer mot gårdsplass. Rikt utskåret stakittgjerde mor gårdsplass.
Interiør	Modernisert
Gårdsplass,	Heller. Meget velholdt.
Uthus	En et. bind.verk. Ubebodd. Bra

Ombygging

1862	Se prot. (30.5.) (BA)
1863	" " (3.2.) (BA)
1865	" " (30.6.) (BA)
1910	Heving av tak i 1.et. Flytting av kjøkken. Nye piper. Endring av fasade mot Skolegt. og gårdsplass (Nye vinduer, ny dør, kunstige søyler på hjørnene) (BA)

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer
Gårdsdører endres

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 24.9.74
Sign J.T.

Gate Skolegt.	nr. 16
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

142.2

